




Byggherre ARH		
Medvirkningsmøte 8 for Rokade C1 og Forbereden		
Dato/tid: 18.09.2024 14:00	Lokasjon: Rikshospitalet B: Seminarrom 3	
Ansvarlig Thea Ekren Koren		Klassifiseringskode Åpen
Beskrivelse Fast møteserie som del av mandat for medvirkning Rokade C1 og Forberedende arbeider		Neste møte i serien

Agenda

001 <input type="checkbox"/>	<p>Velkommen</p> <p>Oversikt deltakere som var i møtet ligger vedlagt her i de to vedleggene</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">   </div>
002 <input type="checkbox"/>	<p>Godkjenning av referat fra forrige møte</p> <p>Referatet ble sendt ut for sent til at det kan godkjennes i møtet. Referatet ligger ute på OUS side nå og behandles i neste medvirkningsmøte. Lenke til møtereferat ligger her</p> <p>Referat fra medvirkningsmøte 19.06.2024</p>
003 <input type="checkbox"/>	<p>Presentasjon del I av møtet Rokade C1</p> <p>Se vedlagt presentasjon som ble gjennomgått i møtet for agendapunktene 004, 005 og 006.</p> <p>20240918MedvirkningsmøteRokadeC1dell.pdf</p>

<p>004</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Status bygging Rokade C1 med fremdriftsplan</p> <p>Gjennomgang av presentasjon for Rokade C1, se sak 003. Her følger hovedpunkter fra status Rokade C1:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Det er gitt informasjon om utsettelse av flytting og ny eierskiftedato for bygg E3 og E4, sengepostene. OUS får tilgang til arealene helgen 09-10. november 2024. OUS kan planlegge med pasientdrift fra uke 46, i år 2024. *Akuttmottaket flytter på senere tidspunkt og denne dato koordineres med OUS i henhold til den verifiserte planen for når midlertidig helikopterlandingsplass er klar for drift, planlagt til uke 5 i 2025. Helikopterlandingsplassen er ikke del av Rokade C1 prosjektet, men inngår i OUS leveranse. Mottaksprosjektet koordinerer flytting med aktuelle parter i OUS. *Bygg 10 er fornøyd med nytt bygg og flytting er planlagt uke 39. *Bygg B2 flytter først inn i arealer i 4. etasje med dialyse og nyrelab, eierskiftet er planlagt oktober 2024. Prøvetaking som skal flytte inn i 1. etasje er planlagt med eierskifte februar 2025. Deretter vil hovedinngangen tas i bruk og skjer samtidig som midlertidig forplass II er klar for drift, tentativ dato for dette er primo mai 2025. *Klinisk forskningspost er planlagt med eierskifte februar 2025. *Arbeidene med EI-fys 5 pågår i regi av OUS, de har byggelderansvaret for denne delen av prosjektet. Planlagt ferdig med eierskifte februar 2025. * Modulbygg tak C, har flyttet inn og det pågår arbeider med å følge opp restanseaktiviteter fra eierskifte på modulbygg tak C. <p>*Foreldreovernatting modulbygg C7 er satt i produksjon. Fremdriften er avhengig av at IG er gitt, nå pågår forebedelser til å starte arbeidet ute. Oppstart leieforhold og innflytting er planlagt november 2024.</p> <p>*C2 sengepost er planlagt med eierskifte desember 2024.</p> <p>*C4 sengepost er planlagt med eierskifte februar 2025.</p> <p>Når det gjelder flytting av sengepost C2 så stiller vernetjenesten spørsmål om når det skal presenteres en oversikt som viser hvordan nye bygg M og N vil påvirke eksisterende dagslys i bygg C2, der det ligger sengeposter. Vernetjenesten har deltatt i befaring av rom for å se på dagslysforhold sammen med HSØ PO og de varsler at de ikke har sett resultater eller fått presentert noen svar på hvordan dagslys vil bli i bygg C2 når nye bygg er ferdig i år 2031. De gjentar at dette har de purret på til HSØ PO gjentakende ganger. HSØ PO kan ikke svare ut saken i møtet og det lages aksjon i møterefateratet om denne saken for videre oppfølging og informasjon.</p> <p>Det kommer innspill fra deltakere i møtet at oversikten i presentasjonen bør skrives med hele årstall så det ikke blir misforståelser om datoer og år, eksempel september 2024.</p> <p style="text-align: center;"><u>23 sep 2024</u> Thea Ekren Koren frist: 20 okt 2024 Presentasjon av hvordan nye bygg vil påvirke dagslys i eksisterende bygg C2 HSØ PO skal presentere for OUS en oversikt som viser hvordan det blir med dagslys når de nye byggene er ferdige. Dette inngår ikke som del av arbeidet med Rokade C1 og Forberedende arbeider. HSØ PO sjekker status og kommer med tilbakemelding til OUS i egen sak utenfor dette møtet.</p>
<p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Status mottaksprosjekt med fremdrift flytting</p> <p>Gjennomgang av presentasjon om Mottaksprosjektet, se sak 003. Det pågår arbeider med å rette feil og restanselister som er etablert for ABU i midlertidig modulbygg tak C.</p> <p>Flytting for UiO inn i bygg 10 begynner torsdag 19. 09.2024 og resterende flytting vil skje fra mandag uke 39 i år 2024.</p>

	<p>Det er planlagt med ny eierskiftedato for bygg E3 og E4, og det pågår arbeider med kortlesere som ivaretar noen dører og heis som ikke var med tidligere.</p> <p>Det etterspørres fra deltakere i møtet en oversikt som viser hvilke datoer som kan vise hva som er ferdig når i forbindelse med utearealer til bygg E3 og E4, denne aksjonen tar Mottaksprosjektet med og svarer ut i planer for kommende periode.</p> <p>Det kommer innspill fra møtet om at det er korte frister med tidsplanen som er utarbeidet for opplæring som skal skje for de ansatte i sengepostene E3 og E4. Klinikkontakten er urolig for om de kan klare å gjennomføre opplæringsplanene. Mottaksprosjektet og klinikken vil jobbe videre med dette punktet etter møtet frem til innflytting.</p> <p>Det kommer spørsmål fra deltakere i møtet om hvor lenge arbeidet med midlertidig trikkeholdeplass og graving i veien vil pågå, jfr. ferdigstillelse og flytting av akuttmottaket. Arbeidet med trikkeholdeplass skal være ferdig med midlertidig holdeplass før akuttmottaket flytter.</p> <p>Det kommer spørsmål fra deltakere i møtet om agregat og luft for kontorer i bygg E3, 5. etasje er tilkoblet. Det blir gitt informasjon om at det er planlagt tilkobling 30.09.2024.</p> <p>Det presenteres en overordnet plan for Rokade C1 og mottaksprosjektets milepæler for ulike aktiviteter. Planrevisjon pågår og den ble sist oppdatert 18.09.2024.</p>
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Avklaringer/særmøter</p> <p>Programleder Stab utvikling i OUS gjennomgår presentasjonen som er vedlagt i sak 003.</p> <p>1. Klinisk forskningspost, reduksjon i omfang Det er gjennomført befaring i funksjonsområdet der dialyse har sin virksomhet i bygg C2 i dag og det pågår utarbeidelse av romprogram for klinisk forskningspost som er enklere enn det som ble planlagt i forprosjektfasen. Det blir gitt tilbakemelding fra klinikken om at det oppleves som god dialog i prosessen og klinikken er fornøyd med nytt løsningsforslag som nå bearbeides videre. Det planlegges særmøte for gruppen med presentasjon av området oktober 2024.</p> <p>Det ligger til denne oppgaven også noen tilleggsoppgaver fra Forprosjektfasen. Det er gjennomført befaring og dialog med medisinsk klinikk for avdeling for Endokrinologi som har arealer i 1. etasje i overgangen bygg C1 og C2. Der ligger også ett rom for mikroskopering som inngår som del av tilleggsoppgaver for Rokade C1. Avklaringer for underlag til detaljprosjektering pågår i dialog mellom OUS og HSØ PO. Flere av de andre mindre ombyggingene som var planlagt i 1. etasje utgår (Medisinsk klinikk).</p> <p>2. C7 foreldreovernatting, endelig løsning ble presentert i medvirkningsmøte 18.06.2024 og de beholder denne løsningen videre. Det var meldt ønsker fra klinikken og disse ble vurdert i OUS, det er avklart at det ikke vil gjøres endringer da det blir for kostbart. Det pågår dialog mellom mottaksprosjektet og klinikken med oversikt møbler, hvitevarer og inventar som er bestilt og inngår som leveranse sammen med bygget. Medvirkningen for dette området er avsluttet.</p>
<p>007</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Forberedende arbeider, del 2 av møtet</p> <p>HSØ PO ved Thea Koren gjennomgikk presentasjonen som ligger vedlagt nederst i denne saken.</p>

Det er gjennomført kartlegginger av rom med rystelsessensitivt utstyr og kartlegging av funksjoner og driftsområder i sykehuset som blir påvirket av støy før-, gjennom og etter sommeren. Dette gjelder for både bygg E mot sør, bygg D mot sør og bygg B1. Arbeidene med forberedende arbeider for å klargjøre byggegrop for J-bygget og arbeidet med å rive tårnet, parkeringskjeller og lage nye brann og rømningsløsninger er i ferd med å avsluttes.

Det er både støy og rystelser i områdene i bygg B1 og der har de både pasientbehandling og rystelsessensitivt utstyr som inngår som del av områder der byggprosjektet har sensorer utplassert og hvor det gis sms-varslings om rystelser går utover avtalte grenser med OUS og UiO.

Det pågår arbeider med å forbedre rutine og varslingsprosess både i HSØ PO linjen og i OUS/UiO linjen. Det har blitt utløst flere varsler og det er usikkerhet fra flere deltakere i møtet knyttet til hvordan både byggprosjektet og driften av sykehuset blir påvirket fremover. Det gis informasjon fra OUS stab utvikling at det er dialog og møter om utstyr som kan være skadet av byggearbeider. Det vil bli fulgt opp med mer informasjon etter møtene er gjennomført.

Det er gjennom erfaringen vi sammen får nå klart for å starte tilsvarende arbeid og kartlegginger på østsiden av byggene med riving av C1 og foreberedelser til grunnentreprise og bygging av MNO-bygg.

Medvirkningsgruppen gir råd til videre arbeid og prosess:

*Det må gjennomføres risikovurdering og avklare veien videre med hvilke tiltak som kan iverksettes både fra byggprosjektet og fra OUS/UiO.

*Det kommer spørsmål fra deltakere i møtet om døren som går fra bygg E1 mot vestsiden der det når byggene er ferdig skal ha ny personalinngang. Kan denne døren kunne benyttes som inngang til vestsiden av eksisterende RH på tidligere tidspunkt enn 2031? Denne avklaringen skal HSØ PO sjekke ut i forhold til fremdriftsplaner, og så må OUS avklare evt. bruk av denne inngangen internt om dette er mulighet.

*Det gis innspill om at OUS har veldig god erfaring med å ha fått varevinduer på store deler av bygget mot byggeplass mot vest. Dette vil være nødvendige tiltak som bør på plass for mange rom også mot øst-siden av bygget.

* UiO gir innspill om at de er organisert med ulike deler av sin virksomhet inn i RH og bruken av bygg og funksjonsområder varierer for ulike parter i UiO. Noe er knyttet til undervisningsarealer som blir berørt og noe er knyttet til kliniske funksjoner eller bygg og eiendom. Derfor oppfordres HSØ PO å være tydelig i innkallinger for møter eller utsendelse av dokumenter, slik at det blir enklere for UiO å delta i prosesser med de riktige ressursene.

*Det er viktig at byggprosjektet er tydelig på hvilken tidshorisont det er snakk om og det er avgjørende for å finne gode løsninger at både OUS og UiO har tid nok til å kunne iverksette kompensierende tiltak når drift blir berørt.

*Vernetjenesten er opptatt av at det må settes opp og anskaffes mobilt måleutstyr for støy, som de kan ha tilgjengelig for å kunne verifisere om arbeidene er slik som mange kan oppleve når støy oppleves som problem for drift. HSØ PO sjekker ut om ikke OUS har slikt utstyr tilgjengelig, og ber om at vernetjenesten kan innkalles til møte med byggeplasskoordinator for å få informasjon.

Når uforutsette hendelser skjer i OUS skal de ansatte forholde seg til gjeldende rutiner og benytte varslingsrutiner og meldeplakaten i OUS HF.

Det kommer innspill fra møtedeltaker om at de opplever at røykeskuret som er montert på midlertidig hovedinngang er til sjenanse for pasienter, ansatte og andre besøkende. Det blir gitt informasjon fra OUS at denne er satt opp av OUS selv, ikke del av arbeidet som HSØ PO har levert. Det er utfordrene å finne den riktige avstanden for slik røykeplass fra hovedinngangen. Plasseres den for langt vekk, blir den ikke benyttet og plasseres den for tett på byggene så er røyken til mer sjenanse for mange. Det jobbes også med skilting og vektertjeneste fortløpende for å henvise personer som oppholder seg i hovedinngangsområdet på best mulig måte.

008

Eventuelt
Ingen saker

NAMN

KLINIK/ORG

STURVA SOLHEIM

BAR

Irene Ø. Fennel

OSS/EIE

ASBJØRN HANSEN

OSS/EIE

Helene Stagesstad

KSM

Thor Pålve Saugeslaup

PHA

Anne Sofie Leffing

KVI

Mette Neergård

NSF

Anders Halden

PRE

Deltaker i medlemsmøte 18/9-24.

NAUN Klinikk / ORG.

Thea Koren HSO PO.

Martin Lieupha DST

Tone M. Olser OSS Steub

Per Arne Jørgensen — u —

Loramus Astorp DST utviking

Wib G. Wilhelmson HAK

Divind Skotland Brukarorg

Fu Oddin Synnes PVO

Jorunn UR! UPO
Fanne Alnehaen KLM

Ruxandra Steadkleiv NITD

Angelika Sorteberg neuro

Anne Gro Valle Vernejenesten

Frida Bårdsen

Nemad Tomic

Bedriftshelsetjenesten
Arbeidsmiljøgruppene


Rokade C1

Forberedende arbeider og byggeplassskiller

Medvirkningsmøte
18. september 2024



Rokade C1



Agenda

Rokade C1

14:00 – 14:05 - Godkjenning av referat fra forrige møte

14:05 – 14:15 - Status bygging Rokade C1 med fremdriftsplan


14:15 – 14:35 - Status mottaksprosjekt med fremdrift for flytting

14:35 – 14:45 - Avklaringer/særmøter

- 1) Klinisk forskningspost, reduksjon i omfang
- 2) C7 foreldreovernatting, endelig løsning

Forberedende arbeid

14:45 – 15:30 - Forberedende arbeid



Godkjenning av referat fra forrige møte

Det er ikke sendt ut referat fra HSØ PO fra medvirkningsmøte 19. juni. Referatet vil bli sendt ut i etterkant av møtet og godkjennes i neste medvirkningsmøte.

Status: Fremdrift Rokade C1

Prosjekt	Status fremdrift
R81 Vaktmesterentreprisen (pågående aktiviteter)	
<u>Portørstue</u> Ingen aktivitet jf. plan	Eierskifte innen utgangen av 02.25
<u>Personalkantine</u> Ingen aktivitet jf. plan	Ferdigstillelse 12.24
<u>Byggherreleveranser til modulbygg tak C</u> Avsluttende aktiviteter knyttet til elektro, sprinkling og branntetting. Se også R87 under.	Ferdigstillelse 09.24
R82 Sengeposter og akuttmottak E3/E4 Ferdigstillelse av slutfaseplan og koordinering med OUS pågår	Eierskifte 11.24
R83 Sengeposter i C2 og C4 Prosjektering av bearbeidet løsning for ombygging av C2 og C4. Siste avklaringer rundt sykeromskanaler for C4 gjenstår.	C2 eierskifte 12.24 C4 eierskifte 02.25
R84 Bygg 10 Innflytting avtalt med UiO til uke 39	Eierskifte 09.24

R85 B2 – Dialyse, Nyrelab, hovedinngang <u>B2, 4. etg Dialyse og Nyrelab</u> Ferdigstillelse av slutfaseplan og koordinering med OUS pågår <u>B2, 1. etg. Prøvetaking, resepsjon, inngang</u> B2 1. etg har flere idriftsettelse. Ombygging av areal til prøvetaking er avhengig av at UiO har flyttet til bygg 10. Riving starter ultimo september og ferdigstilles til februar 2025. I tillegg til prøvetaking skal det etableres ny midlertidig hovedinngang. Ferdigstillelse og eierskifte for disse arealene er under planlegging, og koordineres med ferdigstillelse av utomhusarbeider forlass II.	Mekanisk ferdig 09.24 Eierskifte 10.24 Eierskifte (Prøvetaking) 02.25 Eierskifte hovedinngang under avklaring med forlass II. Tentativt primo mai 25.
R86 Klinisk forskningspost Pågår omfangsavklaring før prosjektet igangsetter prosjektering. Tidligste oppstart byggearbeider er når arealet er fraflyttet. Ingen aktivitet jf. plan	Eierskifte 02.25
R86 Elfys 5 Oppstart arbeider for <u>Elfys 5</u> er 08.24.	Eierskifte 02.25
R87 Modulbygg tak C	Flyttet inn
Ferdigstilt. Pågår oppfølging av enkelte restanser.	
R88 Modulbygg C7 (foreldreovernatting) Søknad om igangsetningstillatelse er sendt. Produksjon av modulene er i gang.	Oppstart leieforhold og innflytting 11.24

Utsettelse av flytting E3/E4

- 6. september 2024 var det et møte mellom OUS og HSØ PO hvor det ble besluttet å utsette flytting til et tidspunkt hvor stabilitet i tekniske systemer kan bekreftes tydeligere.
- HSØ PO planlegger å ferdigstillelse arealene fredag i uke 45, og at OUS kan planlegge med pasientdrift i disse områdene **fra uke 46**. OUS vil få tilgang til arealene helgen 9-10 november.
- Det gjennomføres jevnlig statusmøter mellom OUS, Sykehuspartner og HSØ PO for å holde tett dialog om videre fremdrift, og for å avklare tidspunkt for når flytting og idriftsettelsen skal skje

Status: Fremdrift mottaksprosjektet

- Overtatt modulbygg på tak C
 - Ombygginger
 - Restanser
- Bygg 10 på Gaustad (uke 39)
- B2 4. etasje Dialyse og nyre lab (uke 43, 24. Oktober)
- E3/E4 HLK
- Oppstart C2 – nevro
 - Sykeromskanaler 18. sept
 - Oppstartsmøte 25. sept

ROKADE C1

Overordnet plan

24/25

SEPT

OKT

NOV

DES

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

Modulbygg tak C

FERDIG FLYTTET

Hj.med. overv. & sengep. C1/2.3 > E3/E4

Akuttmottak C1.2 > E3.2

Medisinsk bibliotek B2.1 > Bygg 10

Dialyse og nyrelab C1.1/2 > B2.4

Nevrologisk sengepost C4.4 > C2.3

Thorax intermed/seng C1.4 > til C4.4

Hoveding, prøve og reseps. C1 > B2.1

Klinisk forskningspost til C2


Foreldreovernatting Modulbygg C7

Elfys 5 fra C1 til D4.2


Portørstue fra C1 til D4.2

Personalkantine B1 – fase 2

NB. Planrevisjon pågår, sist oppdatert 18. sept. 2024

 Byggeperiode

 Testing


 Eierskifte

 Flytting

 Ferdig flyttet

 Avhengigheter


E3 Akuttmottak skranke

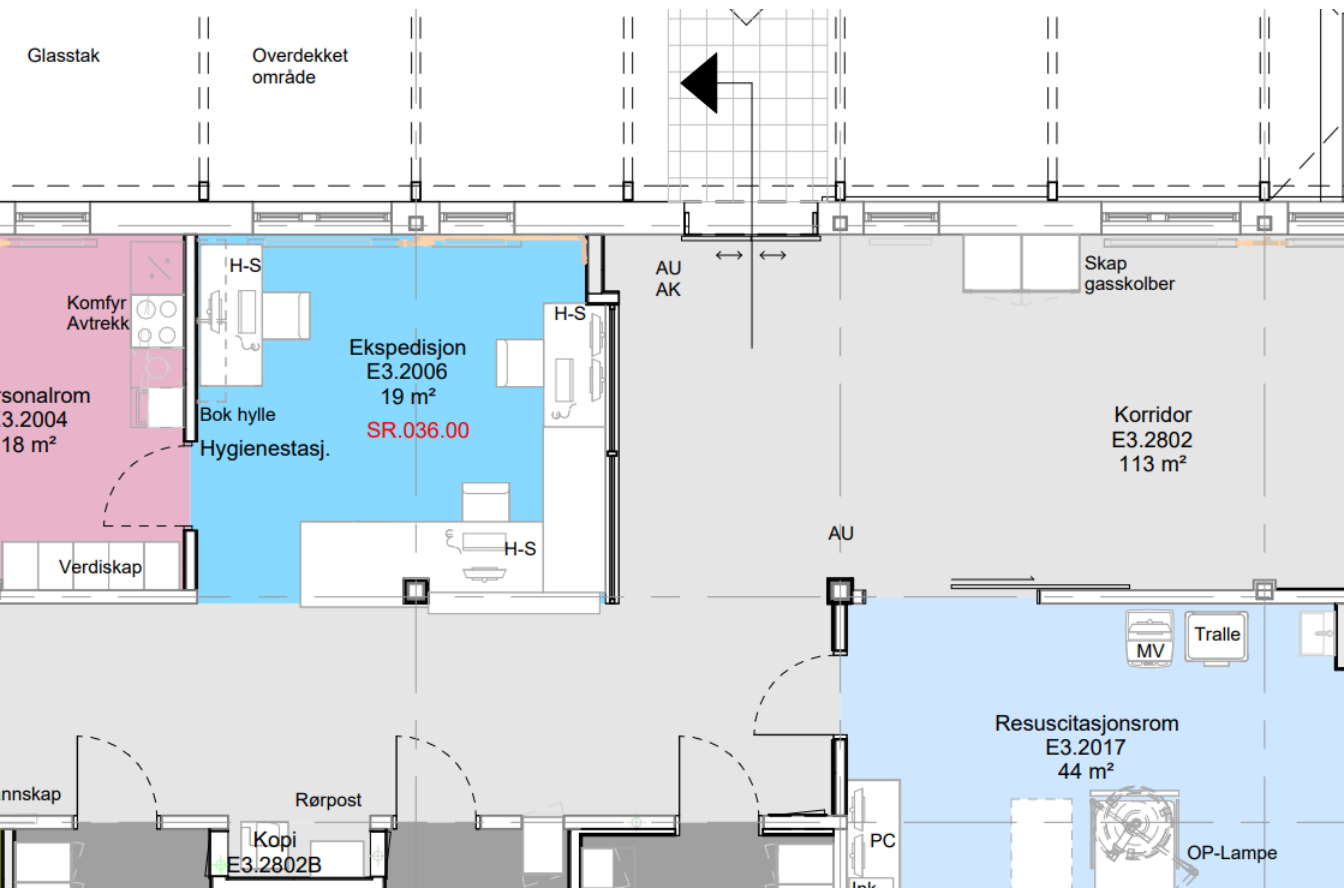

E3 4006 sengerom GR2



E4 4008 - Overvåking/Scop

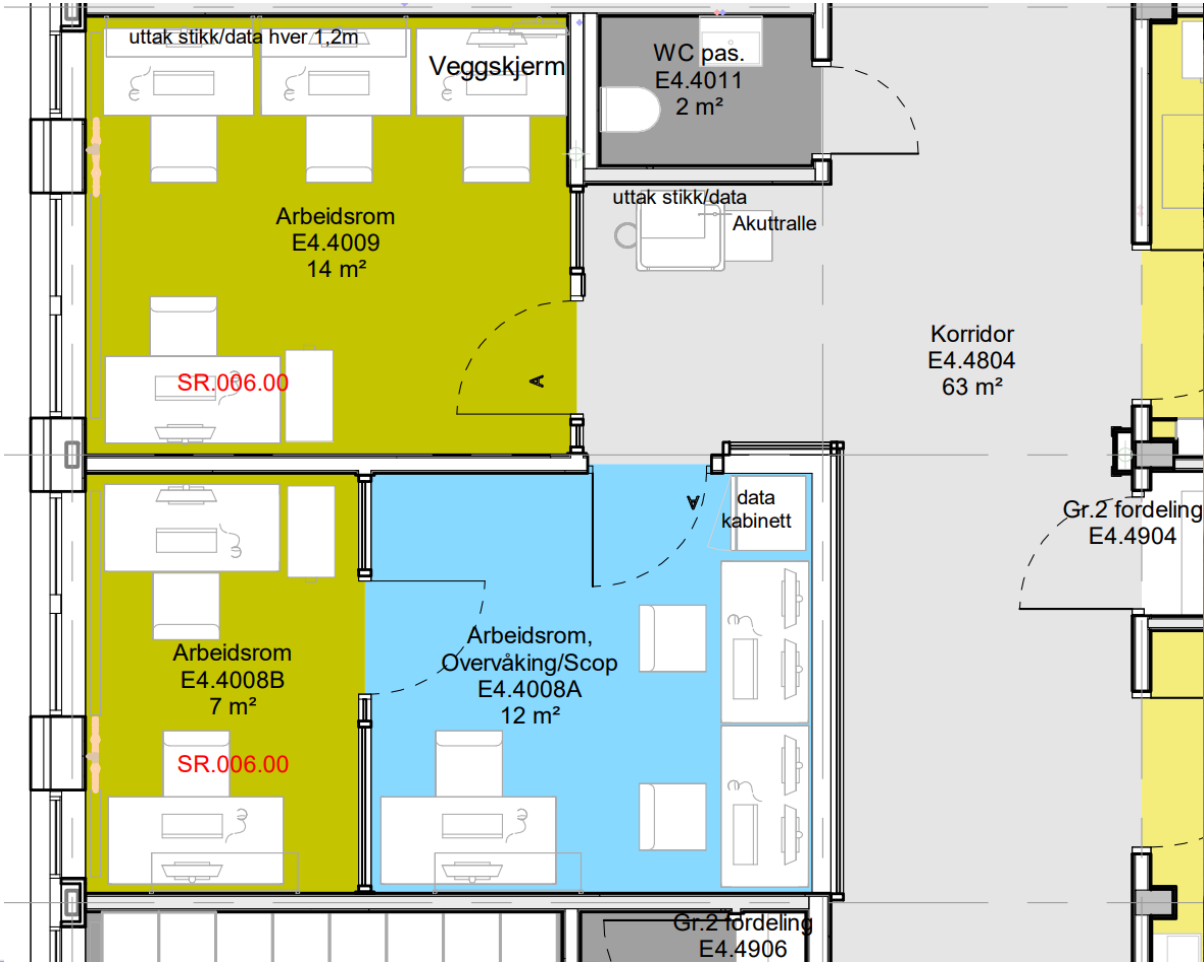

Avklaringer / særmøter

Klinisk forskningspost

Reduksjon av omfang for bygging av klinisk forskningspost, og tilleggsgoppgaver:

- Klinisk forskningspost skal inn i arealene hvor dialysen har vært. En langt **enklere ombygging** enn det som var forespeilet i forprosjektet.
- Dialysens behandlingsrom og arbeidsrom beholdes med små justeringer.
- HSØ PO lager forslag som legges frem for særgruppen
- Flere av de andre mindre ombyggingene som var planlagt i etasjen under utgår (Medisinsk klinikk)



Avklaringer / særmøter

C7 Foreldreovernatting

- Beholder løsning for rom som ble presentert på medvirkningsmøte den 18.06.24
 - Ingen endringer etter medvirkningen, da det blir for kostbart
 - Opprettholder rom som tidligere avtalt, 38 (+15 i E3/E4)
- Møbler, hvitevarer og inventar leveres av utleier



Forberedende arbeid Nye Rikshospitalet



Eventuelt




Medvirkningsmøte forberedende arbeider og byggeplasskiller NRH

18.09.2024

HELSE  SØR-ØST

Agenda


Status fremdriftsplan for ulike entrepriser/arbeider



Status rivearbeider

Forberedende arbeider og byggeplasskiller i bygg B1, D1 og E1

OBJEKTER SOM RIVES

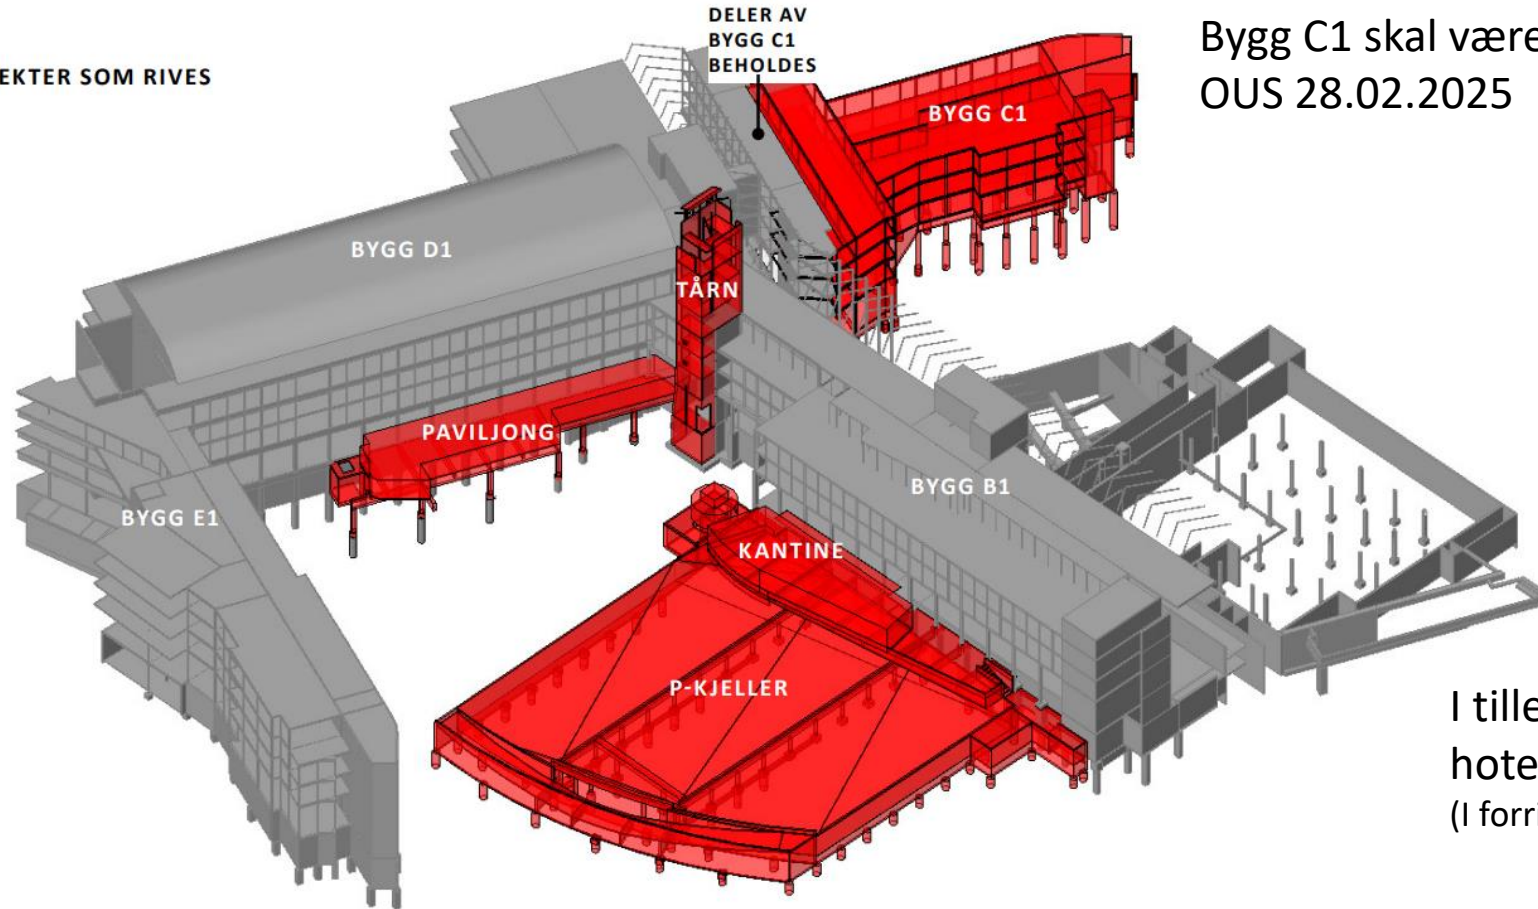

Bygg C1 skal være fraflyttet av
OUS 28.02.2025

I tillegg planlegges rivearbeid for Gaustad
hotell, oppstart 01.12.2024 (Ny dato).
(I forrige møte presentert 20.11.24.)

Arbeider ved byggeplass for J-bygget



Juni 2024



18.09.2024

Status entreprise 2050

- Ferdigstilles nå slutten av september.
- OUS er involvert i tilbakeføringen av arealene innvendig og utvendig



Status arbeider utenfor mot vest




Midlertidig Sognsvannsvei, entreprise 7021



7021 - Sognsvannsveien midlertidig fase


- Oppstart arbeider: Juni 2024
- Ferdigstillelse: Desember 2025
- Deler av traséen etableres midlertidig (ca. 6 år)
- Permanent trasé utføres senere som egen entreprise

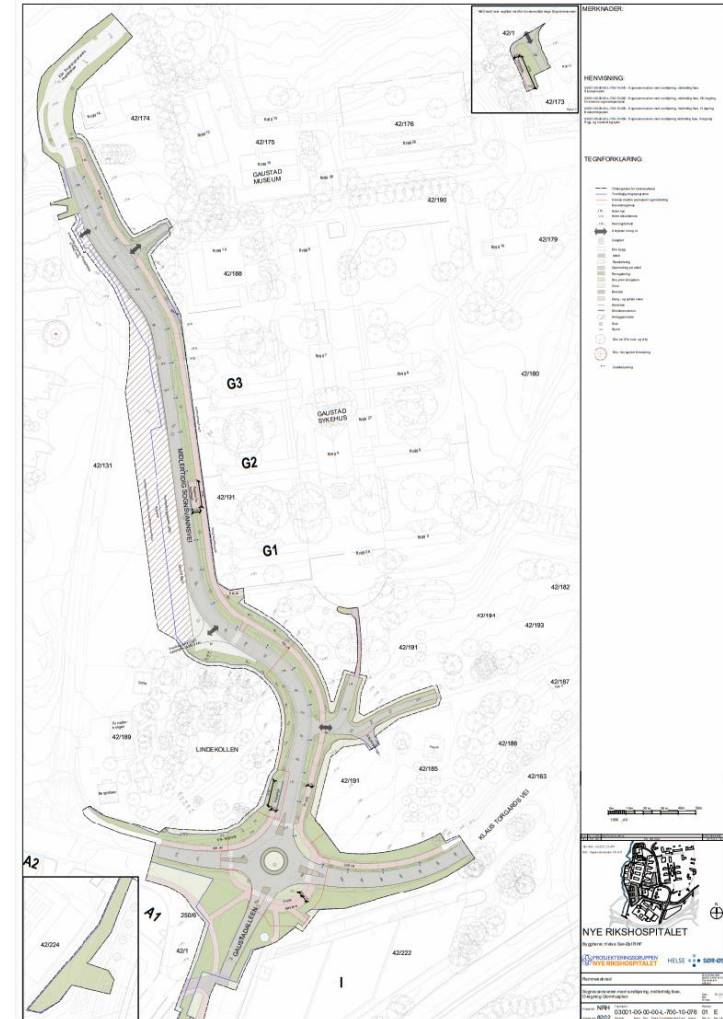

Eksempel på fortløpende dialog og deling av informasjon med OUS og UiO


Midlertidig Sognsvannsveien

Visuell plan uke 37 - 39

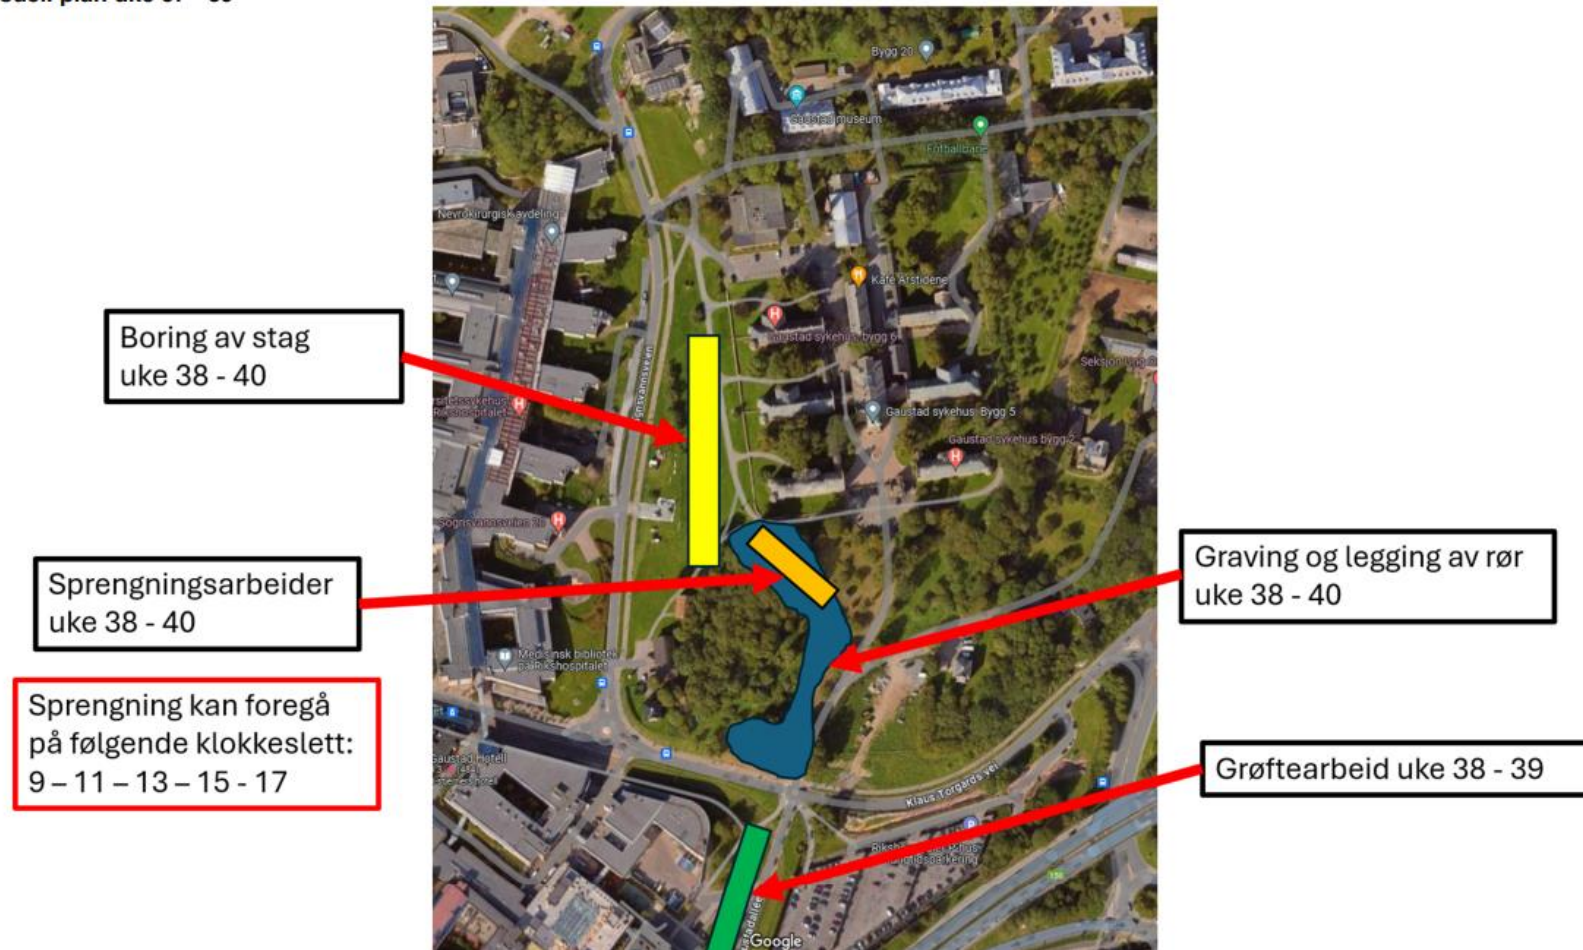

7031, midlertidig trikkeendeplass

- Oppstart arbeider: September 2024
- Ferdigstillelse: Januar 2025
- Midlertidig trikkeendeplass i Gaustadalleen (ca. 6 år)
- Buss for trikk fra mandag 16.09.24

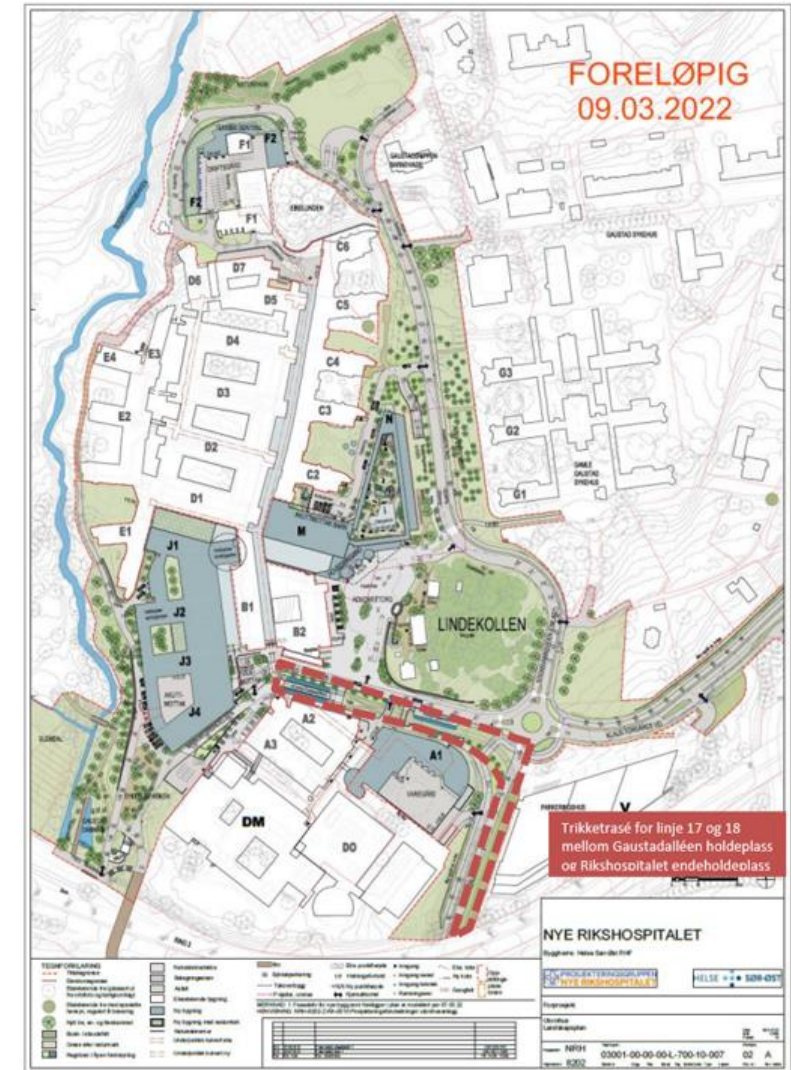

Rive C1, status oppstart riving mars 2025



Bygg C1 skal være fraflyttet av OUS 28.02.2025. Rivearbeidet starter mars 2025.


Det skal gjennomføres møte OUS for å kartlegge omfang og veien videre, jfr. konsekvenser for sykehus i drift. Eksempelvis, støy, vibrasjoner, midlertidige vegger, brann og rømningkartlegginger osv.

Det er planlagt å bruke erfaringer fra samhandlingen vi har hatt med OUS og UiO på vestsiden av bygget videre i arbeidet på østsiden der C1 skal rives og bygg MNO etableres.

Har medvirkningsgruppen innspill til prosessen og erfaringene fra arbeidet vi nå har vært gjennom?

Midlertidig forplass II

- Planlagt oppstart: 30. januar 2025

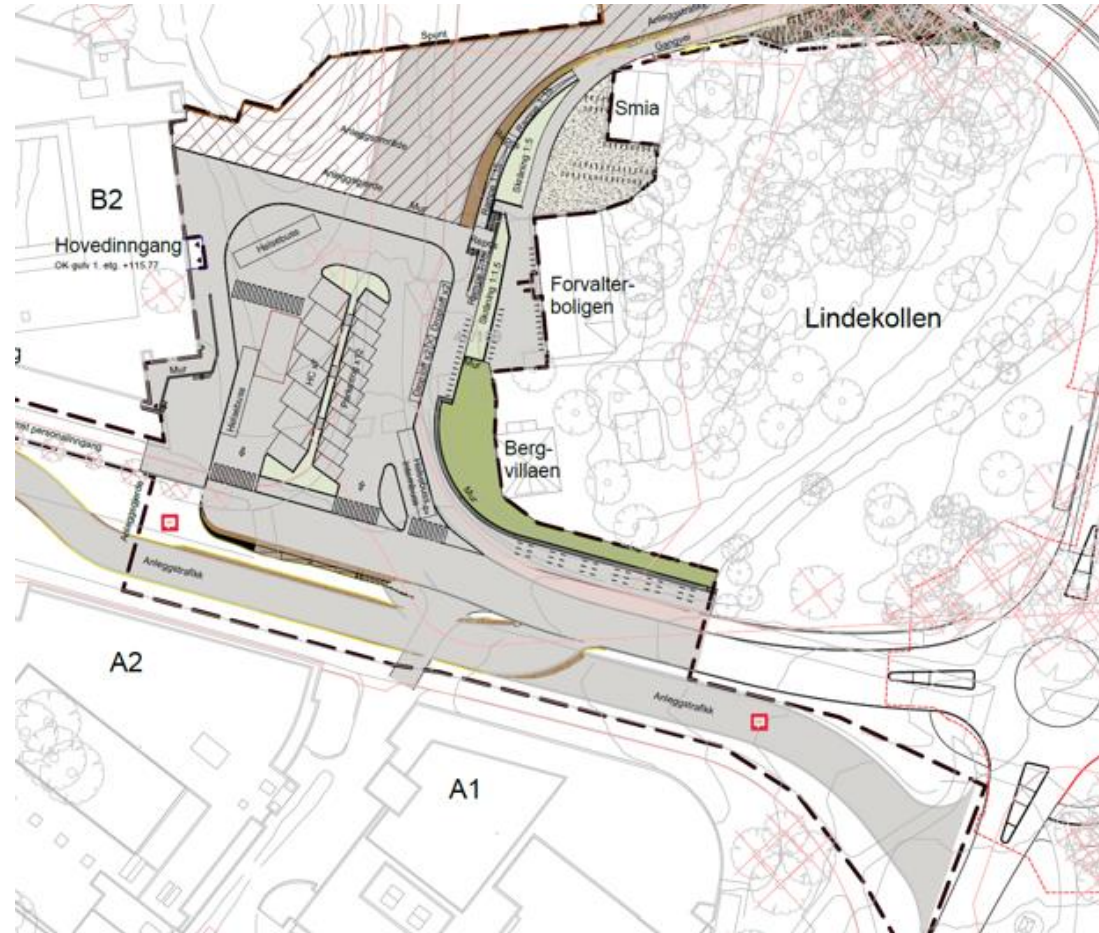

Veien videre

- Arbeider som pågår er ikke del av forberedende arbeider – fases ut på samme måte som Rokade C1 fra dette faste medvirkningsmøtet

[-] U2 Bygg	16.12.22	30.09.31
[-] U2F Utomhus	16.12.22	29.10.30
+ 7010 Forb. arb. i sykehusparken, beredskapsvei fra nord og rigg I	01.02.23	04.10.24
+ 7011 Utomhusarbeider vest	21.02.28	29.10.30
+ 7020 Midlertidig forplass	16.12.22	13.06.24
+ 7021 Sognsvannsveien m/rundkjøring midlertidig fase	25.07.23	22.01.26
+ UTGÅR 7022 Midlertidig forplass II (inkluderes i 7021)	09.12.24	20.06.25
+ 7023 Utomhusarbeider øst	01.03.27	19.11.29
+ 7024 Sognsvannsveien	03.05.27	27.11.29
+ 7031 Midlertidig trikkeendeplass	19.06.23	18.12.24
+ 7032 Permanent trikk	07.05.25	22.11.29
+ 7033 Utomhusarbeider sør	13.06.25	11.11.27
+ 7034 Klaus Torgårdsvei øst	11.05.26	30.06.28
+ 7036 Klaus Torgårdsvei vest	07.06.27	04.04.29
+ 7037 Gaustadalleen	02.06.25	26.11.26
+ 7038 Permanent signal	04.08.25	28.11.29
+ 7041 Utomhusarbeider nord	24.04.28	01.11.29
+ 7042 Midlertidig vei rundt F2	08.01.25	30.01.26
+ U2C Rigg og drift	21.04.23	30.09.31
+ U2D Grunnarbeider og råbygg	10.05.23	20.12.28
+ U2E Innvendige arbeider	23.05.23	29.05.30
+ U2H VDS og TS	25.11.24	09.11.29

Eventuelt
