

# Nye Aker og Nye Rikshospitalet

## Medvirkningsmøte 10 for Rokade C1 og Forberedende arbeider NRH



Dato/tid:  
29 jan. 2025 14:00

Lokasjon:

Ansvarlig  
Thea Ekren Koren

Klassifiseringskode

Beskrivelse  
Del av medvirkningsprosess for Rokade C1 og Forberedende arbeider NRH

Neste møte i serien

### Minutes of Meeting

ID: 354331

01



#### Velkommen og deltakelse

Velkommen til møte på Teams.  
Det er utsent agenda og presentasjon i forkant av møte.  
Deltakere i møtet ligger vedlagt.  
Møte er delt i to deler, første del omhandler Rokade C1 og andre del omhandler forberedende arbeider med tema Riving C1.

[Deltakere medvirkningsmøte 29.01.25.png](#)

| 2. Deltakere                                  |
|---|
| Navn  |
| Kristin Louise Borch                          |
| David artaud (Ikke bekreftet)                 |
| Martin Lieungh                                |
| Nils Einar Wilhelmssen                        |
| Jorun Ur (Ekstern)                            |
| Else Riise                                    |
| Angelika Gabriele Sorteberg                   |
| Hanne Elisabeth Akselsen                      |
| Ilebrekke, Stian (Ekstern)                    |
| Mari Elise (Ikke bekreftet)                   |
| Tone Elisabeth Mydske Olsen                   |
| Thor Børre Sangesland                         |
| Mette Neergård (Ikke bekreftet)               |
| Koren, Thea (Ekstern)                         |
| Anders Halden                                 |
| Lorang Åstorp                                 |
| Øivind Skotland (HLF Oslo Nord-Øst) (Ekstern) |
| David Artaud (Ikke bekreftet)                 |

02



#### Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte 27.11.24 ble godkjent uten kommentarer.

03



#### Status Rokade C1 og gjennomgang av fremdriftsplan

Se vedlagt presentasjon utsendt.  
Spørsmål og kommentarer svares ut i møtet. Fremdriftsplanen er stram, men alle jobber for å klare fremdriften som er satt.  
Det er gjennomført to erfaringsmøter der ressurser fra OUS og HSØ PO har gjennomgått status for alle gjenstående aktiviteter i prosjektet. En gjennomgang for å redusere risiko og sikre at partene er omforent om hva som bygges og hvordan områdene overleveres til driftsfunksjoner i OUS.

Det er også etablert og gjennomføres ukentlige statusmøter for Rokade C1, her deltar fra OUS Steinar Holm EIE, Martin Lieungh programleder NRH i stab utvikling og Lorang Åstorp mottaksprosjektet i stab utvikling. Fra HSØ PO deltar Pål Høylyie, Stian Ilebrekke og Thea Koren.

**04**



**Status mottaksprosjekt med fremdrift flytting**

Se vedlagt presentasjon utsendt.

Spørsmål og kommentarer svares ut i møtet.

Det er tett dialog med klinisk drift som er i flytteprosess.

Det vil bli en hektisk periode i slutten av februar, da flere skal flytte på samme tid, derfor må alle være litt tolmodige med hensyn til hvor raskt det blir gitt svar på spørsmål.

Helipadprosjektet jobber med å bli ferdig før tidligere antatt og dette vil også påvirke flytteplaner for akuttmottak.

Det blir stilt spørsmål fra prehospitaltjenester om de kan få tilkomst til den nye veien og innkøring til akuttmottaket slik at de kan produsere en film for å dele med alle som skal finne frem til nytt akuttmottak på RH. Rokade og mottaksprosjektet bekrefter at dette skal de løse, egen dialog etableres for å følge opp denne aksjonen.

**05**



**Nest møte er siste medvirkningsmøte som er planlagt for Rokade C1**

Møteserien avsluttes for disse prosjektene.

Medvirkningsgruppen gir råd om at møteserien bør fortsette for å dele informasjon og motta innspill om forberedende arbeider. Det avklares videre prosess og tilbakemelding om veien videre blir gitt i neste møte.

06



## Del 2: Forberedende arbeid med tema teknisk frakobling og rivearbeid bygg C1

Se vedlagt presentasjon som blir gjennomgått i møtet.

Spørsmål og kommentarer svares ut i møtet

Det er spørsmål fra UiO om hvordan arbeidet vil påvirke arealer i bygg B2 der det ligger seminarrom. Det er gjort vurderinger av støy og rystelser og det vil kunne påvirkes. Det er viktig for UiO at de blir involvert i forhold til informasjon både fra OUS og PO når det kommer til støyende arbeider som kan påvirke drift.

Rystelser og sprenging som pågår i byggegrop J påvirker hverdagen til mange. Det blir gitt informasjon i møtet fra HSØ PO om at det nå gjøres tiltak med å endre metode pga høye utslag på rystelsesmålere. Det skal "sømbøres" mot bygg B, dettes om tiltak som skal gi mindre utslag når da sprengning kan starte opp igjen. Det blir gitt anbefaling fra medvirkningsgruppen at det er viktig for de som er tett på å få informasjon om når sprenging starter opp igjen, slik at erfaring kan deles, og effekten av tiltakene kan vurderes. HSØ PO følger opp denne aksjonen.

UiO stiller spørsmål til hvor mye støy det vil bli fra arbeidene som skal starte når midlertidig forplass II skal begynne med arbeider utomhus. HSØ PO følger opp denne internt og tar dette med til ukentlige OK-møter som pågår, slik at informasjon deles.

Brukerutvalget er opptatt av å si at det tiltider nå er vanskelig for pasienter å finne frem til rett sted i tide. Mange omveier og midlertidige gangveier inn og ut av sykehuset. Det er belastene at trikk ikke kjører helt til sykehuset og for bevegelseshemmende er dette krevende, også særlig når snøen kommer.

Medvirkningsgruppen ønsker til neste møte å ha mer informasjon om trafikksituasjon og status trikk, buss, HC parkering.

Det blir stilt spørsmål fra KLM om areler med dyrestall i bygg A blir ivaretatt i forhold til støy og rystelser, det bekreftes fra HSØ PO at det er dialog fortløpende og at det ikke er rapportert i statusmøter utfordringer her.

Det blir gitt informasjon fra Kristin Borch i stab utvikling om at de nå har etablert "interne nabormøter for de som blir påvirket mest av arbeidene med riving C1. Hun er kontaktpersonen som ansatte i OUS kan bruke for slike interne møter og det er også involvert lokal vernetjeneste i disse møtene.

Det gis informasjon om at det er innkalt til informasjonsdelingsmøte for klinikkontakt og teknisk drift på Gaustad sykehus om omleggingen av Sognsvannsveien. HSØ PO har innkalt til møte fredag 7. februar 2025.

[medvirkning forberedende arbeider - tema riving c1.pdf](#)

**19 feb 2025 Thea Ekren Koren**

**Aksjon: Thea Ekren Koren**

**Tema for neste møte**

Beslutning/aksjon: Det er ønsket fra medvirkningsgruppen at tema neste møte blir informasjon om det som skjer på øst-siden av RH.

# Medvirkningsmøte forberedende arbeider

HSØ PO ved Thea Koren 29.01.25

HELSE  SØR-ØST



# Byggeplasskamera 29.01.25, fra pipe





# Status fra HSØ PO

- Ulike områder med aktivitet byggeplass
- Faseplaner oppdatert desember 2024 [Faseplaner 03001-00-00-00-Z-700-20-001+\(10\).pdf](#)
- Status brukerutvalg og programstyret i OUS er gitt
- Etablert ny møteserie mellom OUS og HSØ PO: Koordinering OUS HF (Stab utvikling, Vernetjenesten) og HSØ PO.
- Møte gjennomført med OUS og vernetjeneste, gjennomgang hvordan nye bygg påvirker eksisterende bygg med dagslys



# Frakobling og riving bygg C1

- Frakobling og riving C1
  - Det er gjennomført ROS for arbeidene
  - Det skal gjennomføres ny ROS februar, OUS involvert
  - Avklart datoer for når ulike deler av bygget fraflyttes av OUS og når HSØ PO har tilkomst
  - Utarbeidelse av detaljfaseplaner som angir konsekvenser for drift, eksempelvis frakobling teknisk utstyr, flytting av rørpost osv.
  - OUS har etablert ukentlige møter med de som er Sykehusnaboer til C1
  - Etablering av varevinduer pågår C2 og B2

| C1: etg | I dagens arealer                                   | Tilkomst<br>Entreprenører, Dato |
|---------|--|---------------------------------|
| 4       | HLK, TKAS1 -Thoraxkir. Interm. sengepost (1317 m2) | 13.03.2025                      |
| 3       | HLK, KADI1 overvåkning (829 m2)                    | 10.03.2025                      |
|         | HLK, Angiolab 39 (Elfys 5) (98 m2)                 | 10.03.2025                      |
|         | OSS, Portørstua (67 m2)                            | 10.03.2025                      |
|         | KLM, klinisk forskningspost (212 m2)               | 10.03.2025                      |
| 2       | AKU, AKMM3 – akuttmottak (355 m2)                  | 10.03.2025                      |
|         | KIT, ATXD4 Dialyse (555 m2)                        | 10.03.2025                      |
|         | Sentralbord  | 10.03.2025                      |
| 1       | KLM, MBK – prøvetaking (818 m2)                    | 10.03.2025                      |
|         | KIT, Nyrelab (155 m2)                              | 10.03.2025                      |
| C1.2904 | Kom. rom tømmes fra 11.03-12.03                    | 13.03.2025                      |



# Byggegrup J

- Sprengning – ulike perioder ulik erfaring både hos OUS/UiO og hos oss. Nå iverksettes tiltak med sømboring (Thea forklar). Erfaringer til andre områder vi skal ha byggeplasser
- Avklare arbeider som vil påvirke drift bygg E1 sommer 2025 for å sikre mulighet for evt. OUS organisatoriske tiltak
- Oppstart detaljer og avklaringer med OUS om hvordan råbygget vil påvirke sykehus og UiO i drift, etter som bygget reiser seg.
  - Byggerekkefølge
  - Stilas
  - Tilkoblinger og grensesnitt






# Ulike områder og aktivitet

Kart

[Google Maps](#)

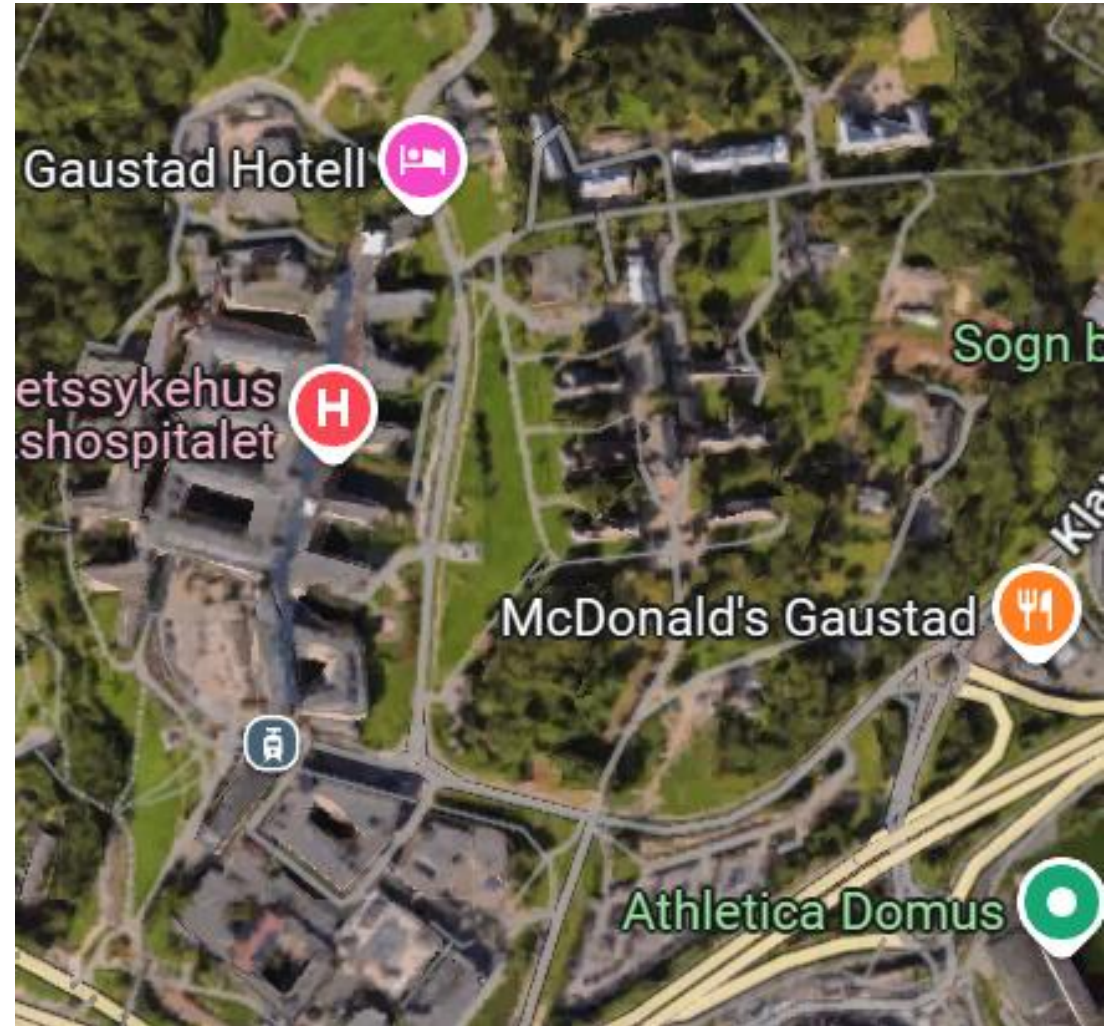

# Annet

- Utomhus veier, trikk, buss, biler, sykler og gående
  - Buss for trikk – forsinket, er utfordrende for alle
  - Påske 2025?
  - Etablert trafikk møte ukentlig OUS og PO
- Kunst flyttes og fjernes
- Brakker
- Kraner
- Erfaringsdeling – PHA Gaustad sykehus innkalt
- Hotell rives nå - april

## 2. Deltaere medvirkningsmøte 29.01.25.png (01 - Vel

Navn

Kristin Louise Borch

David artaud (Ikke bekreftet)

Martin Lieungh

Nils Einar Wilhelmsen

Jorun Ur (Ekstern)

Else Riise

Angelika Gabriele Sorteberg

Hanne Elisabeth Akselsen

Ilebrekke, Stian (Ekstern)

Mari Elise (Ikke bekreftet)

Tone Elisabeth Mydske Olsen

Thor Børre Sangesland

Mette Neergård (Ikke bekreftet)

Koren, Thea (Ekstern)

Anders Halden

Lorang Åstorp

Øivind Skotland (HLF Oslo Nord-Øst) (Ekstern)

David Artaud (Ikke bekreftet)
