

Møte:	Medvirkning forprosjekt - Møte 03 akt D - 27 Høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk døgnområde - Nye Aker	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	123222	Dok.dato:	19.05.2022
Møtedato:	12.05.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 15.00	Sted:	Forskningsparken, Møterom Hagen 4
Referent:	Elisabeth S. Grannes	Neste møte:	Uke 36/37 2022

Deltakere/mottakere:

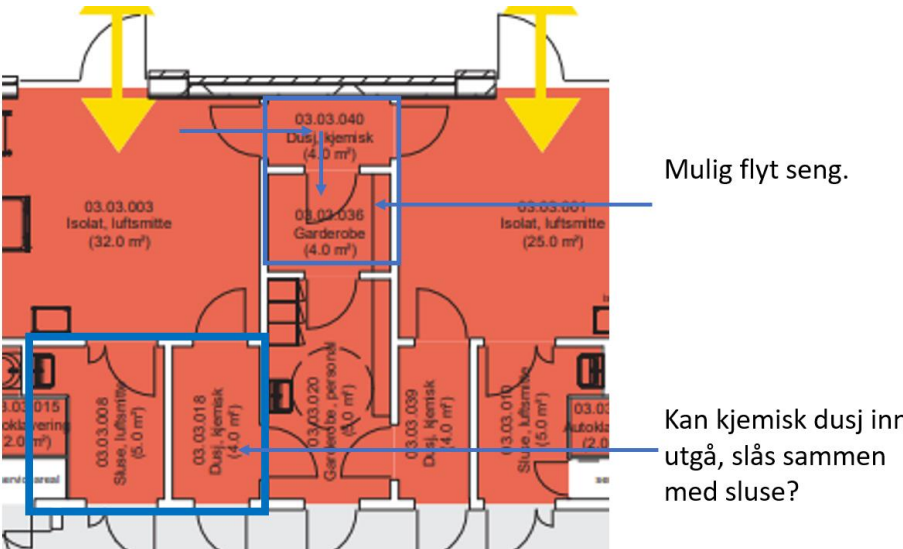
Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Torgun Wæhre	Gruppeleder	OUS	X
Arne Broch Brantsæter	Fagperson	OUS	X
Vidar Ormaasen	Fagperson	OUS	-
Malin Jørgensen	Fagperson	OUS	X
Madelen Foss Smedholen	Fagperson	OUS	X
Mette Sannes	Fagperson	OUS	X
Vibeke Graarud	Fagperson	OUS	-
Camilla Elise Nielsen	Fagperson	OUS	X
Liv Hesstvedt	Fagperson	OUS	-
Aase Nilsen	Fagperson	OUS	X
Jon Øyvind Sparby	Fagperson	OUS	-
Egil Lingaas	Fagperson	OUS	-
Frank Olav Pettersen	Tillitsvalgt DNLF	OUS	-
Anne-Thea Linner Ruud	Tillitsvalgt NSF	OUS	X
Kent Roger Bjørklund	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Ingeborg Sand	Fasilitator	HSØ PO	X
Elisabeth Grannes	Referent	HSØ PO	X
Hege Anette Martinsen for Berit Haugen	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	X
Kristina Rogers	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X

Henni Steineger	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Kristin Spradbrow Treloar	Landskapsarkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Lars Otterli	RIV	Prosjekteringsgruppen	X
Lars Andersen Sørig	Landskapsarkitekt	Prosjekteringsgruppen	-

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS</p> <p>Møtet er det tredje i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til og med høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 27 Høysikkerhetsisolat og infeksjonsmedisinsk døgnområde.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassering i bygget • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer • Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 2. Gjennomgang av utsendt materiale 3. Gjennomgang av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D2 4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 5. Veien videre 			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-01		Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 v/gruppeleder Referatet ble godkjent.			
03-02		Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK Arkitekt gikk gjennom underlaget som var sendt ut før møtet. Tegningene ble diskutert og punktene gjengitt under (03-02-01 – 03-02-14) ble fremhevet.			
03-02-01		Utgang fra pasientrom Det vil være mulig å trille seng ut fra alle pasientrom som ligger mot fasade mot nord. Dørbredder og -typer spesifiseres i detaljprosjekt.	Info		
03-02-02		Sluser Sluser i korridor i avdeling for høysikkerhetsisolater kan tas ut.	ARK	Møte D4	Åpen
03-02-03		Medisinhåndtering Medisinnisje er tegnet inn sentralt i avdelingene. Det pågår en prosess i Nye OUS for å avklare innhold i, utforming og arbeidsprosesser i medisinnisjen. Gruppen uttrykker bekymring med hensyn til tilberedning og lagring av medikamenter i medisinnisjen, og mener det bør gjøres en ROS-analyse av konseptet om farmasitun. Nye OUS opplyser om at farmasitunet som betjener plan 2 skal bemannes hele døgnet.			
03-02-04	01.03.113 01.03.110 01.03.112 01.03.115 01.03.111 01.03.114	Arbeidsplasser Arbeidsstasjonen som er tegnet inn i infeksjonsmedisinsk døgnområde bør ha to plasser som kan sitte og jobbe i ro og fred innenfor en større arbeidsstasjon. Arbeidsstasjon, indre sone og Arbeidsstasjon, ytre sone bytter plass på tegning.	ARK	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		Det ses på mulighet for en felles ekspedisjon i plan 2. Det pågår en prosess i Nye OUS og PO for å få mer kontorareal i plan 2.	Info		
03-02-05		Rørpost Plassering av rørpost i korridor anses som en god plassering for avdelingen. Plassering av rørpost må i tillegg vurderes i forhold til IN2-laben. Det er vanligvis 30-40 forsendelser pr. dag til IN2-laben. Gruppen sender en beskrivelse av dette.	Gruppen	02.06.22	Åpen
03-02-06		Autoklaver HSI Arealet for autoklavene på tegningene illustrerer et fotavtrykk tilsvarende størst tenkelig type autoklaver, likt innspill gruppen har gitt tidligere i prosessen. Fotavtrykket er større en autoklavene som blir installert på Ullevål i dag. Badene på tegningen er ikke funksjonell slik de er tegnet ut i underlaget. Prosjekteringsgruppen vil jobbe videre med ulike løsninger for å ivareta en god funksjon i området. Alt utstyr bortsett fra madrass kjøres i autoklaven. Smittevern har bekreftet at gjeldene kravspesifikasjon fortsatt vil være gjeldene for autoklavene på høysikkerhetsavdelingen.	HSØ PO/PG/OUS		
03-02-07		Gjennomstikkskap Gruppen ønsker gjennomstikkskap fra sluse for isolatene i høysikkerhet og infeksjonsmedisinsk døgnområde. Gruppen diskuterer dette med smittevern og melder tilbake til Nye OUS.	Gruppen	02.06.22	Åpen
03-02-08		Kirurgisk håndvask Det bør være kirurgisk håndvask til det største isolatet i HSI som skal benyttes til kirurgiske prosedyrer.	RUT	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02-09	03.03.040 03.03.018 03.03.041 03.03.042	<p>Sluse, garderobe og kjemisk dusj til HSI</p> <p>Dersom kjemisk dusj innenfor garderoben kan gjøres større og sluse en seng, foreslår gruppen å slå sammen kjemisk dusj og sluse mot korridor. ARK ser på mulighet for å svinge seng gjennom ut-dusjen.</p> <p>RIV undersøker mulighet for ifm desinfisering av luft i kombinert sluse/kjemisk dusj.</p> 	ARK RIV	Møte D4 Møte D4	Åpen Åpen
03-02-10		<p>Inneslutningsnivå</p> <p>Gruppen undersøker om det er krav til BSL-4 for isolatene på HSI.</p>	Gruppen	02.06.22	Åpen
03-02-11	03.03.024 03.03.019	<p>Kjemisk dusj</p>	ARK	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
	03.03.049	Flyt inn/ut til IN 4 lab er ok. Ingen dører skal slå inn i kjemisk dusj (stor). ARK oppdaterer tegningene			
03-02-12		Lagring av biologisk materiale Logistikk for oppbevaring av biologisk materiale og mellomlagring avklares av Nye OUS.	Nye OUS	Møte D4	Åpen
03-02-13	03.03.023	IN2-lab Gruppen oversender utstyrsliste til IN2-lab.	Gruppen	02.06.22	Åpen
03-02-14		Utomhus Uteområdet ved infeksjonsmedisinsk døgnområde kan skjermes og avgrenses med vegetasjon eller gjerde. Gruppen vurderer om det er behov for gjerde. Gruppen beskriver behov for opphold- og treningsområder utendørs. Det er behov for spylesone med avrenning til kum og utekran for mulighet for utendørs dekontaminering av personal og epi-shuttle. Gruppen avklarer krav til størrelse på telt.	Gruppen Gruppen Gruppen	02.06.22 02.06.22 02.06.22	Åpen Åpen Åpen
03-03		Gjennomgang av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D2 Ingen gjenstående punkter utover det som ble diskutert i punktene over.			
03-04		Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring Oppsummering med aksjonspunkter ble gjennomgått i møtet og sendt til Nye OUS v/fagkoordinator etter møtet. Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte. OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 02.06.2022.	Gruppen	02.06.22	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Veien videre</p> <p>Etter denne møteserien (D3), vil tilbakemelding vurderes og oppdateres/implementeres i materiale til D4.</p> <p>Forprosjektrapporten ferdigstilles til uke 37 og er grunnlag for beslutning om å gå videre til detaljprosjekt (B4). Dette er planlagt besluttet i styret i Helse Sør-Øst RHF innen utgangen av 2022.</p> <p>Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles, utvikles løsninger videre som del av medvirkningsprosessen i forprosjektet, og det kan medføre at skisser i forprosjektrapporten og materiale til møte D4 er på ulikt nivå.</p> <p>Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre i detaljprosjektet (tentativ oppstart 2023).</p>	Info		
