

NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

S - INFEKSJONSAVD og HSI



NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

S - INFEKSJONSAVD OG HSI

Rom gjennomgått i møte 1 og oppfølgingsmøte etter møte 1			
Romnr	Romnavn	Møte 1	Oppfølging møte 1
03.03.001	Isolat, karantene	X	
03.03.010	Sluse, luftsmitte	X	
03.01.012	Bad, luftsmitte	X	
03.03.003	Isolat, høysikkerhet	X	
03.03.023	Laboratorium, IN2	X	
03.03.024	Laboratorium, IN4	X	
01.03.085	Sluse, luftsmitte	X	
01.03.102	Bad, luftsmitte	X	
03.03.034	Vaktrom		X
03.03.050	Arbeidsrom		X
03.03.028	Lager tøy		X
03.03.025	Lager utstyr		X
03.03.036	Garderobe		X

Prosjekt:

Nye Aker

Medvirkning i funksjonsprosjektet

Medvirkningspulje 1, Gruppe S

Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisinsk døgnområde

1 Medvirkningsmøter

Det er gjennomført følgende møteserier i henhold til møteplaner for Gruppe S Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisinsk døgnområde:

Møte	Dato	
1	21.06.2023	
2	19.09.2023	

2 Endringer


Endringer i etterkant av medvirkning er listet her:

Nummer	Endring
1	Nytt gr.2 rom Det er kommet tilbakemelding fra OUS om at alle høysikkerhetsisolatene skal ha gr.2 rom. Det er derfor programmert et ekstra gr.2 rom (hvert gr.2 fordeling dekker 2 isolater). Dette er plassert mot korridor mellom pauserom og vaktrom og det er da plass til to arbeidsplasser i vaktrom.
2	Verdiskap/veskeskap Verdiskap til ansatte er flyttet ut av pauserom og plassert i korridor utenfor pauserom i infeksjonsavdeling. I HSI er verdiskap plassert på pauserom.
3	Miljøstasjon Miljøstasjon for avfall er programmert og plassert syd i infeksjonsavd.

4	Lager rent nisje og akuttinisje Plassering er justert, og plassert mer sentralt i korridorkryss, og for å optimalisere areal.
5	Pasientovervåkning i vaktrom Det er programmert pasientovervåkning i vaktrom for HSI, men dette er ikke ferdig programmert fra RIKT. Pasientovervåkning er planlagt i midten mellom de to arbeidsstasjonene og skjerm for helselogistikksystem henger på vegg over.
6	Bad og sluser Plassering av utstyr i bad og sluser er videre prosjektert.
7	IN2 lab Plassering av utstyr og møblering er prosjektert videre for best utnyttelse av areal og funksjon. Utslagsvask er endret til kum i benk som øvrige laber. Oppbevaring er endret til skap under benk på ende av lab øy, samt to skap på hver side av labbenk. To høyskap i lab og to høyskap i mikroskopilab.
	IN4 lab Plassering av utstyr og møblering er prosjektert videre for best utnyttelse av areal og funksjon. Vegg/dør til kjemisk dusj er endret for å ivareta inntransport av sikkerhetsbenker.

HØYSIKKERHETSISOLAT

INFESJONSMEDISINSK DØGNOMRÅDE

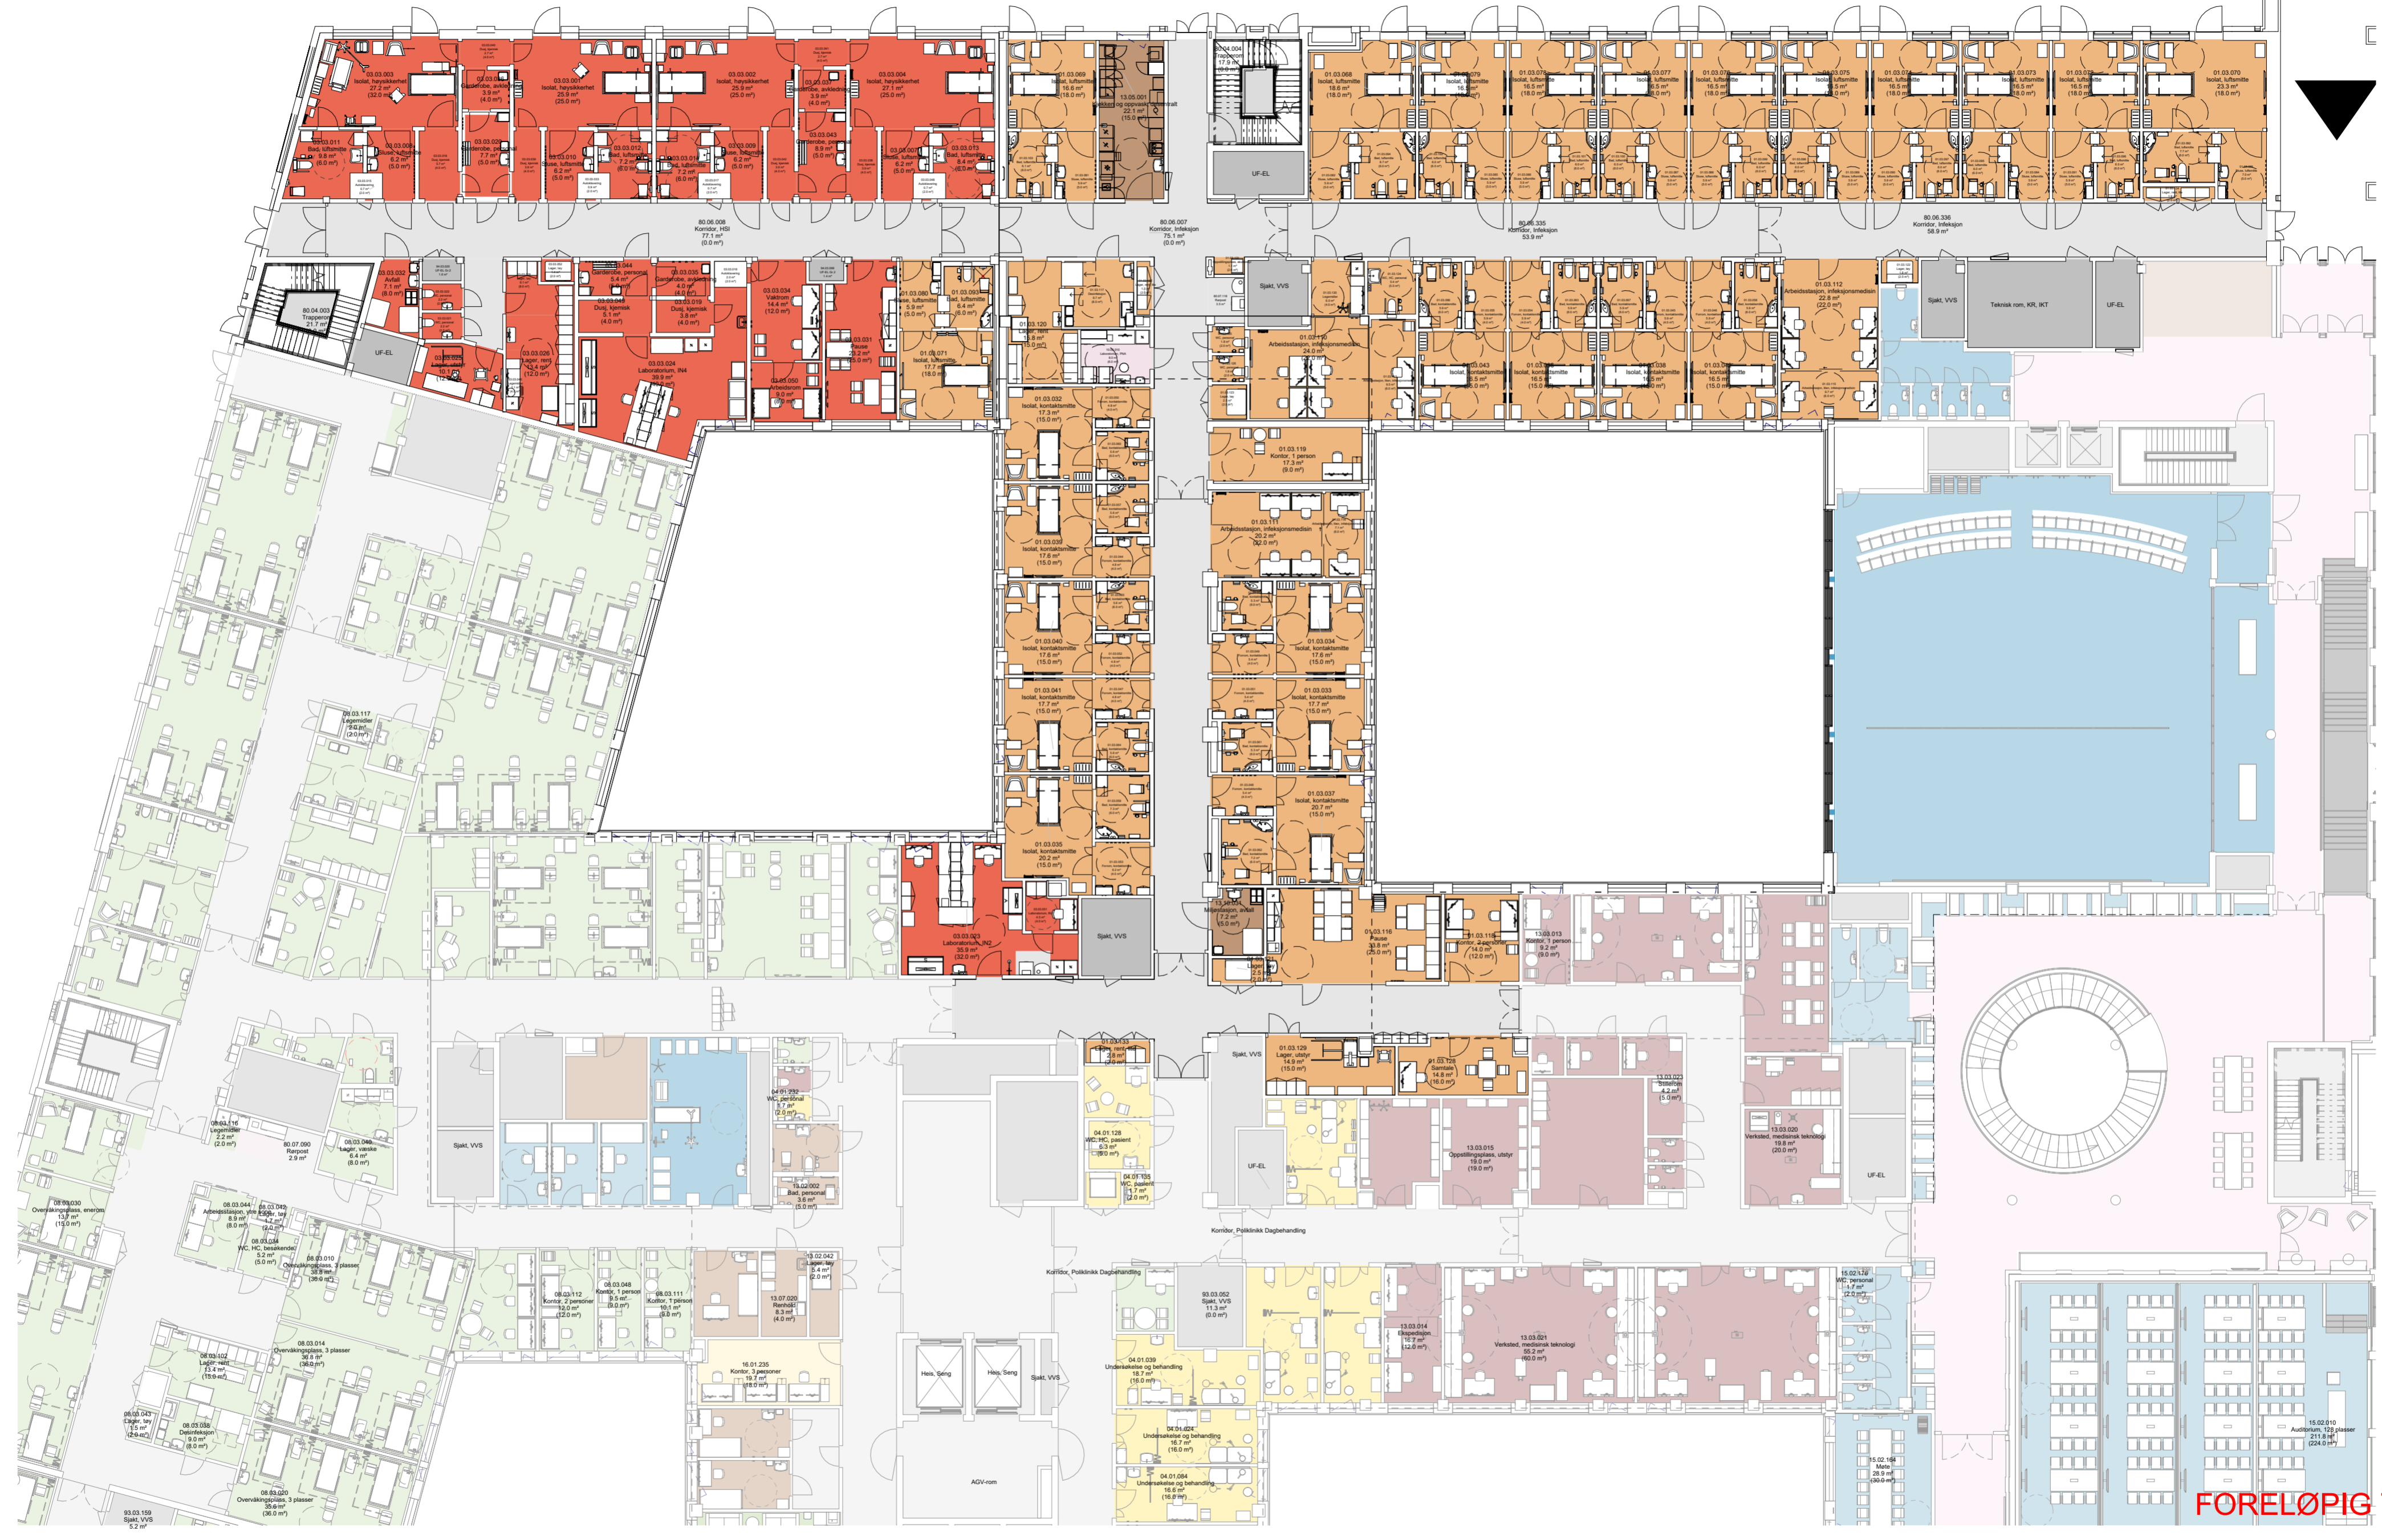

FORELØPIG TEGNING

FORSKNING OG UNDERVISNING

Dato: 28.08.2024
Mål: 1 : 200

Nye Aker
AMF-S04 - Infeksjon og HSI PLAN
