

Medvirkningsmøte forberedende arbeider

HSØ PO ved Thea Koren 29.01.25


HELSE  SØR-ØST

Byggeplasskamera 29.01.25, fra pipe



Status fra HSØ PO

- Ulike områder med aktivitet byggeplass
- Faseplaner oppdatert desember 2024 [Faseplaner 03001-00-00-00-Z-700-20-001+\(10\).pdf](#)
- Status brukerutvalg og programstyret i OUS er gitt
- Etablert ny møteserie mellom OUS og HSØ PO: Koordinering OUS HF (Stab utvikling, Vernetjenesten) og HSØ PO.
- Møte gjennomført med OUS og vernetjeneste, gjennomgang hvordan nye bygg påvirker eksisterende bygg med dagslys

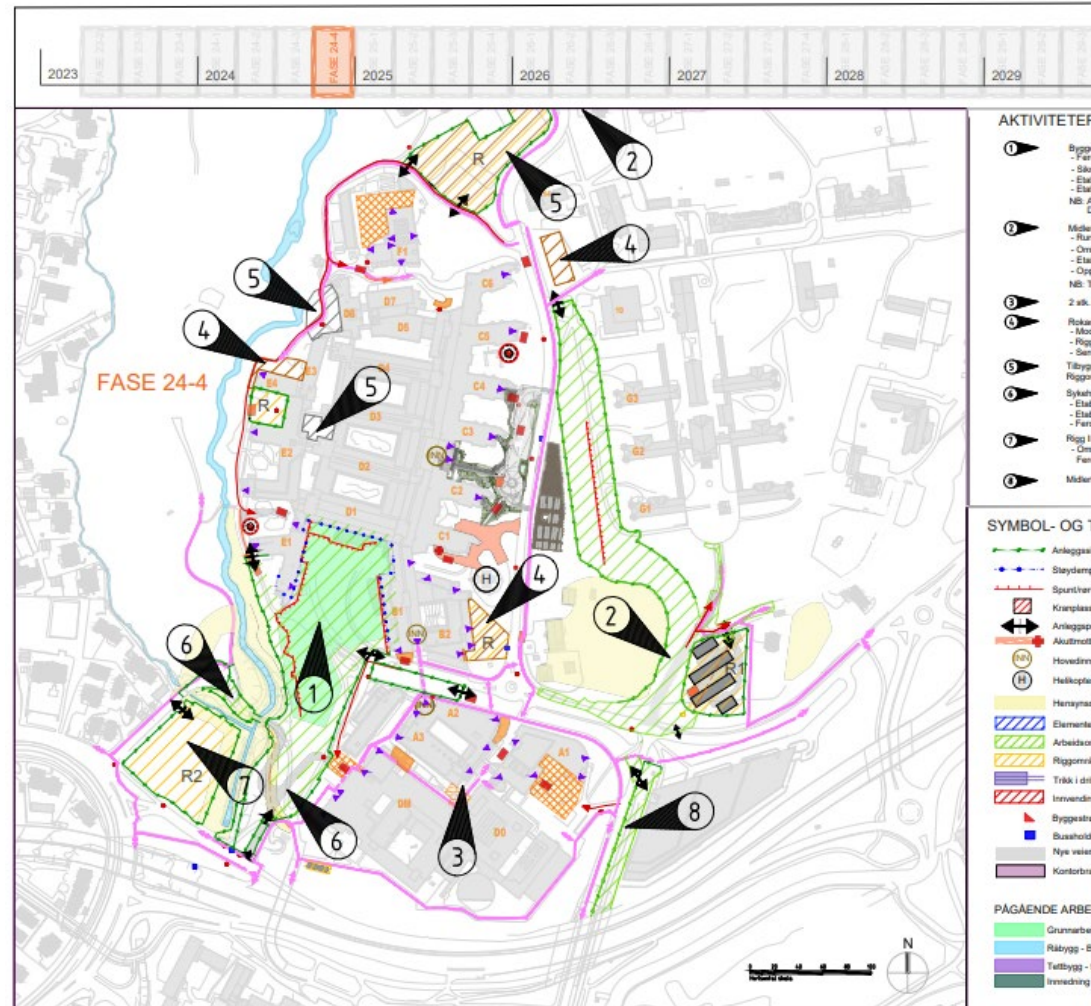

Frakobling og riving bygg C1

- Frakobling og riving C1
 - Det er gjennomført ROS for arbeidene
 - Det skal gjennomføres ny ROS februar, OUS involvert
 - Avklart datoer for når ulike deler av bygget fraflyttes av OUS og når HSØ PO har tilkomst
 - Utarbeidelse av detaljfaseplaner som angir konsekvenser for drift, eksempelvis frakobling teknisk utstyr, flytting av rørpost osv.
 - OUS har etablert ukentlige møter med de som er Sykehusnaboer til C1
 - Etablering av varevinduer pågår C2 og B2

C1: etg	I dagens arealer	Tilkomst Entreprenører, Dato
4	HLK, TKAS1 -Thoraxkir. Interm. sengepost (1317 m2)	13.03.2025
3	HLK, KADI1 overvåkning (829 m2)	10.03.2025
	HLK, Angiolab 39 (Elfys 5) (98 m2)	10.03.2025
	OSS, Portørstua (67 m2)	10.03.2025
	KLM, klinisk forskningspost (212 m2)	10.03.2025
2	AKU, AKMM3 – akuttmottak (355 m2)	10.03.2025
	KIT, ATXD4 Dialyse (555 m2)	10.03.2025
	Sentralbord	10.03.2025
1	KLM, MBK – prøvetaking (818 m2)	10.03.2025
	KIT, Nyrelab (155 m2)	10.03.2025
C1.2904	Kom. rom tømmes fra 11.03-12.03	13.03.2025

Byggegrup J


- Sprengning – ulike perioder ulik erfaring både hos OUS/UiO og hos oss. Nå iverksettes tiltak med sømboring (Thea forklar). Erfaringer til andre områder vi skal ha byggeplasser
- Avklare arbeider som vil påvirke drift bygg E1 sommer 2025 for å sikre mulighet for evt. OUS organisatoriske tiltak
- Oppstart detaljer og avklaringer med OUS om hvordan råbygget vil påvirke sykehus og UiO i drift, etter som bygget reiser seg.
 - Byggerekkefølge
 - Stilas
 - Tilkoblinger og grensesnitt



Ulike områder og aktivitet

Kart

[Google Maps](https://www.google.com/maps)

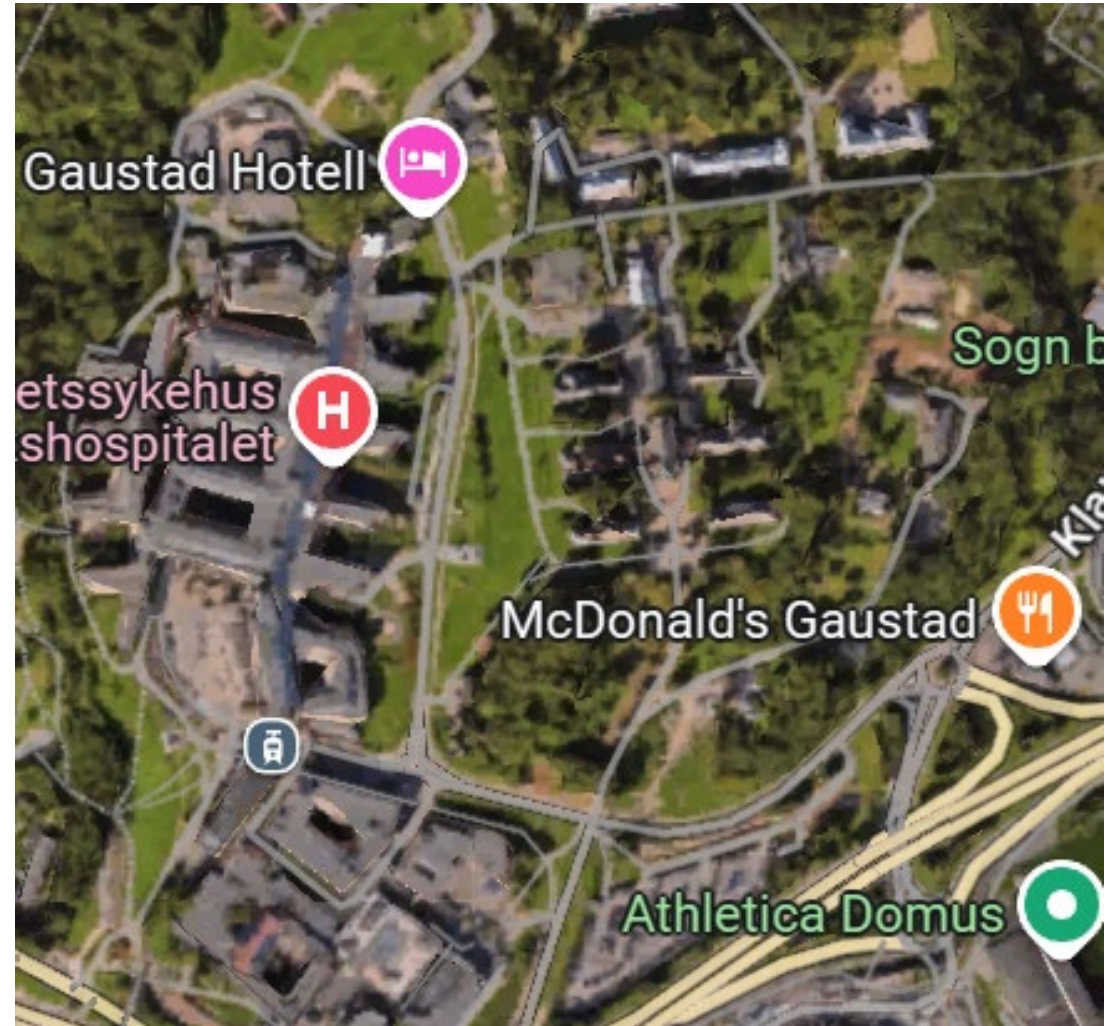

Annet

- Utomhus veier, trikk, buss, biler, sykler og gående
 - Buss for trikk – forsinket, er utfordrende for alle
 - Påske 2025?
 - Etablert trafikk møte ukentlig OUS og PO
- Kunst flyttes og fjernes
- Brakker
- Kraner
- Erfaringsdeling – PHA Gaustad sykehus innkalt
- Hotell rives nå - april
